

本事業へのご理解とご協力をいただきありがとうございます。
令和7年度から令和8年度における今後の工程表と今月の工事状況をお知らせします。



次期リサイクル施設整備に係る

敷地造成工事日より

第6号

発行日・令和8年2月
発行者・佐賀県東部環境施設組合

工程表

工事名: 佐東環第231号 次期リサイクル施設整備に係る敷地造成工事


工期 自 令和 7年 1月 21日
至 令和 9年 3月 19日

計画工程表
実施工程表

工事内容	令和7年												令和8年												令和9年		
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工																											
搬入道路工																											
敷地造成工																											
擦付け道路工																											
片付け																											

工事の状況

上空からの写真

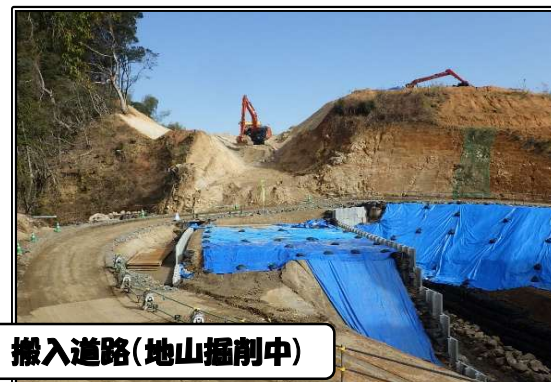

搬入道路(地山掘削中)



敷地造成(盛土中)

令和8年1月時点での進捗率は**38.1%**です。
2月は敷地造成の補強盛土と擦付け道路を作業中です。
3月も、敷地造成の補強盛土と擦付け道路を施工していきます。

